

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和6年4月11日（木）

2 確認箇所

固体廃棄物貯蔵庫第10棟建設予定地

3 確認項目

固体廃棄物貯蔵庫第10棟建設工事の進捗状況

4 確認結果の概要

廃炉作業において発生するがれき等の屋外一時保管を解消するため、固体廃棄物貯蔵庫第10棟の建設工事が進められていることから、工事の進捗状況について確認を行った。なお、固体廃棄物貯蔵庫第10棟はA～C棟の3棟により構成されており、A棟6月、B棟9月、C棟2025年3月の竣工予定として作業が進められている。（図1）（前回確認：[令和6年1月22日](#)）

- ・ A棟建設予定地においては、建屋の建設が完了し、建屋内では設備設置作業が行われていた。（写真1）
- ・ B棟建設予定地においては、建屋外壁パネルの設置が完了しており、建屋内ではコンクリート製遮へい壁の設置作業が行われていた。（写真2）
- ・ C棟建設予定地においては、敷地北西側において基礎設置のためのコンクリート打設作業が行われていた。（写真3）



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図




(写真 1 - 1)
固体廃棄物貯蔵庫第 1 0 棟 (A 棟)
建設予定地の状況
(北西側から撮影)
(令和 6 年 1 月 2 2 日撮影)



(写真 1 - 2)
固体廃棄物貯蔵庫第 1 0 棟 (A 棟)
建設予定地の状況
(北西側から撮影)
(令和 6 年 4 月 1 1 日撮影)



(写真 1 - 3)
固体廃棄物貯蔵庫第 1 0 棟 (A 棟)
建屋内における通信設備の設置作業
状況

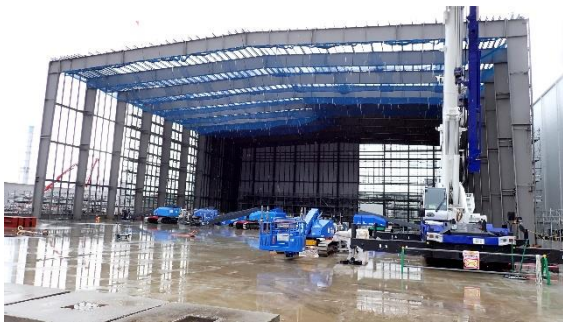

(写真 2 - 1)
固体廃棄物貯蔵庫第 1 0 棟 (B 棟)
建設予定地の状況 (北側から撮影)
(令和 6 年 1 月 2 2 日撮影)



(写真 2 - 2)
固体廃棄物貯蔵庫第 1 0 棟 (B 棟)
建設予定地の状況 (北側から撮影)
(令和 6 年 4 月 1 1 日撮影)



(写真2-3)
固体廃棄物貯蔵庫第10棟 (B棟)
建屋内におけるコンクリート製遮へい壁の設置作業状況



(写真3-1)
固体廃棄物貯蔵庫第10棟 (C棟)
建設予定地の状況 (北側から撮影)
(令和6年1月22日撮影)



(写真3-2)
固体廃棄物貯蔵庫第10棟 (C棟)
建設予定地の状況 (北側から撮影)
(令和6年4月11日撮影)



(写真3-3)
固体廃棄物貯蔵庫第10棟 (C棟)
基礎設置のためのコンクリート打設
作業状況 (北西側から撮影)

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。
